

ALLEGATO "A"

Comune di Montù Beccaria
Provincia di PV

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto 6000 campanili
Interventi di recupero della rete viaria comunale.
CUP H93D13000310001 - CIG 5872163BA

COMMITTENTE: Comune di Montù Beccaria

CANTIERE: Strade comunali varie, Montù Beccaria (PV)

Montù Beccaria, 24/07/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Sclavi Daniele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Legale Rappresentante Quaroni Amedeo)

Ingegnere Sclavi Daniele
Via Costiolo 1
27044 Canneto Pavese (PV)
Tel.: 3392102101 - Fax: 0385 798331
E-Mail: daniele.sclavi@alice.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	2	2	01/09/2014	02/09/2014
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	25/02/2015	27/02/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	08/09/2014	09/09/2014
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2	04/09/2014	05/09/2014
STRADE						
Formazione di fondazione stradale	1	E	10	14	10/09/2014	23/09/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	11	15	26/09/2014	10/10/2014
Posa di segnali stradali	1	E	2	2	23/02/2015	24/02/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	5	5	16/02/2015	20/02/2015
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	24/09/2014	25/09/2014
Posa di pavimenti per esterni	1	E	28	38	07/01/2015	13/02/2015
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	10	14	06/11/2014	19/11/2014
Posa di speco fognario prefabbricato	1	E	5	5	27/10/2014	31/10/2014
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	1	E	3	3	03/11/2014	05/11/2014
	1	E	5	7	20/11/2014	26/11/2014
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	8	13	27/11/2014	09/12/2014
Posa di geotessuto	1	E	5	8	29/12/2014	05/01/2015
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	3	3	10/12/2014	12/12/2014
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	1	1	15/12/2014	15/12/2014
SCAVI E RINTERRI						
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	1	1	04/09/2014	04/09/2014
Rinterro di scavo	1	E	2	2	27/10/2014	28/10/2014
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	13/10/2014	17/10/2014
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	3	20/10/2014	22/10/2014
Scavo eseguito a mano	1	E	2	2	23/10/2014	24/10/2014
OPERE STRUTTURALI						
CEMENTO ARMATO						
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	1	1	24/12/2014	24/12/2014
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	18/12/2014	18/12/2014
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	1	1	23/12/2014	23/12/2014
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	1	1	17/12/2014	17/12/2014
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	2	4	19/12/2014	22/12/2014
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	1	1	16/12/2014	16/12/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


Nome attività	Durata	25 Ago 14		01 Set 14				08 Set 14				15 Set 14									
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	125 g	▶																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	Z1																			
Smobilizzo del cantiere	3 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g																			Z1	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2 g																	Z1			
STRADE	115 g	▶																			
Formazione di fondazione stradale	10 g																			Z1	
Formazione di manto di usura e collegamento	11 g																				
Posa di segnali stradali	2 g																				
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g																				
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g																				
Posa di pavimenti per esterni	28 g																				
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g																				
Posa di speco fognario prefabbricato	5 g																				
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	8 g																				
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g																				
Posa di geotessuto	5 g																				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strac	3 g																				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g																				
SCAVI E RINTERRI	39 g	▶																			
Tracciamento dell'asse di scavo	1 g	Z1																			
Rinterro di scavo	2 g																				
Scavo a sezione obbligata	5 g																				
Scavo a sezione ristretta	3 g																				
Scavo eseguito a mano	2 g																				
OPERE STRUTTURALI	7 g																				
CEMENTO ARMATO	7 g																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in e	1 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f	1 g																				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in eleva:	2 g																				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda	1 g																				

Nome attività	Durata	25 Ago	30	31	01 Set 14			08 Set 14				15 Set 14										
					02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
LEGENDA Zona:																						
Z1 = ZONA UNICA																						

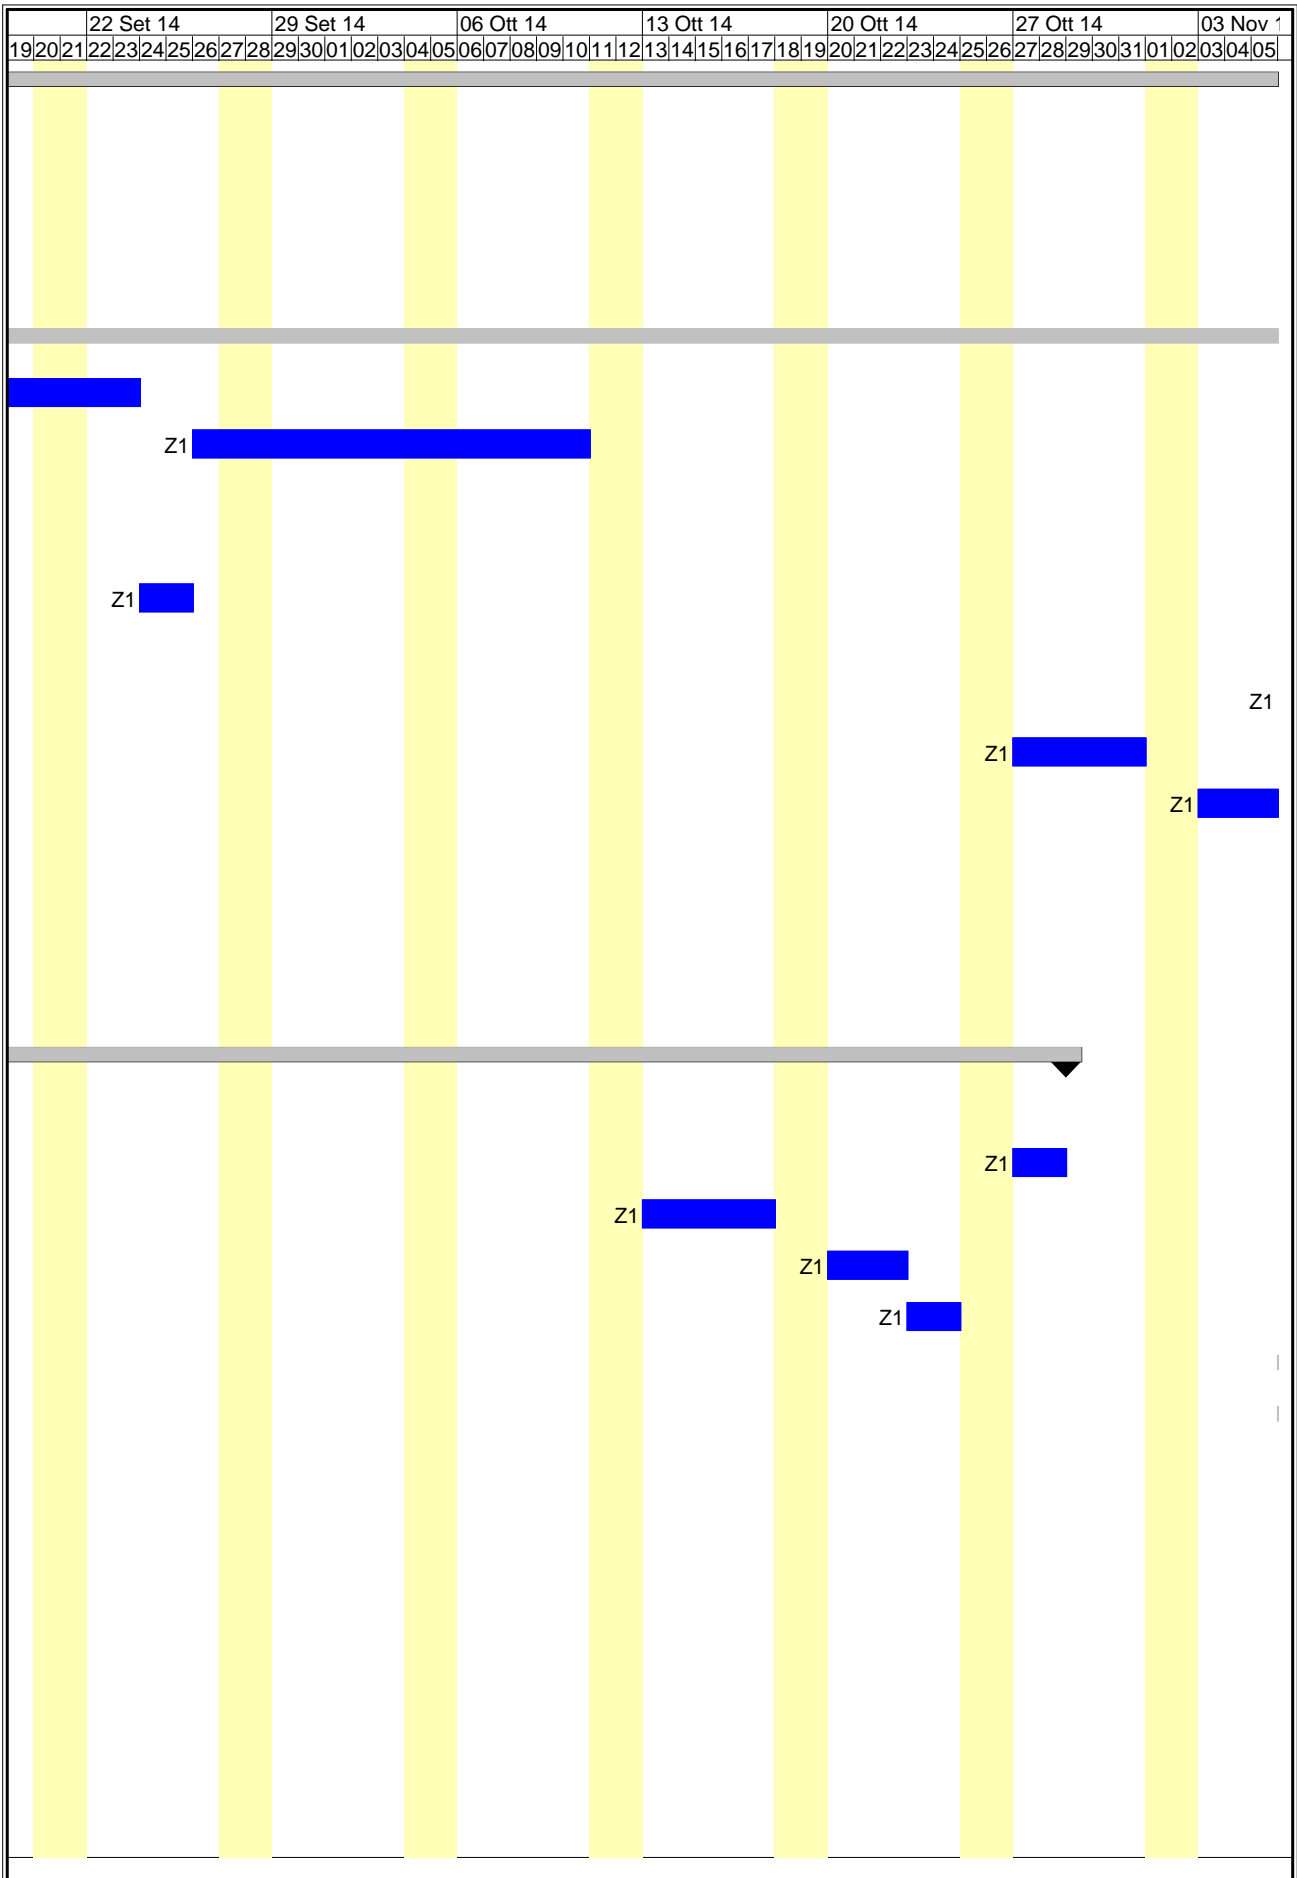


		22 Set 14				29 Set 14				06 Ott 14				13 Ott 14				20 Ott 14				27 Ott 14				03 Nov 1																					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05

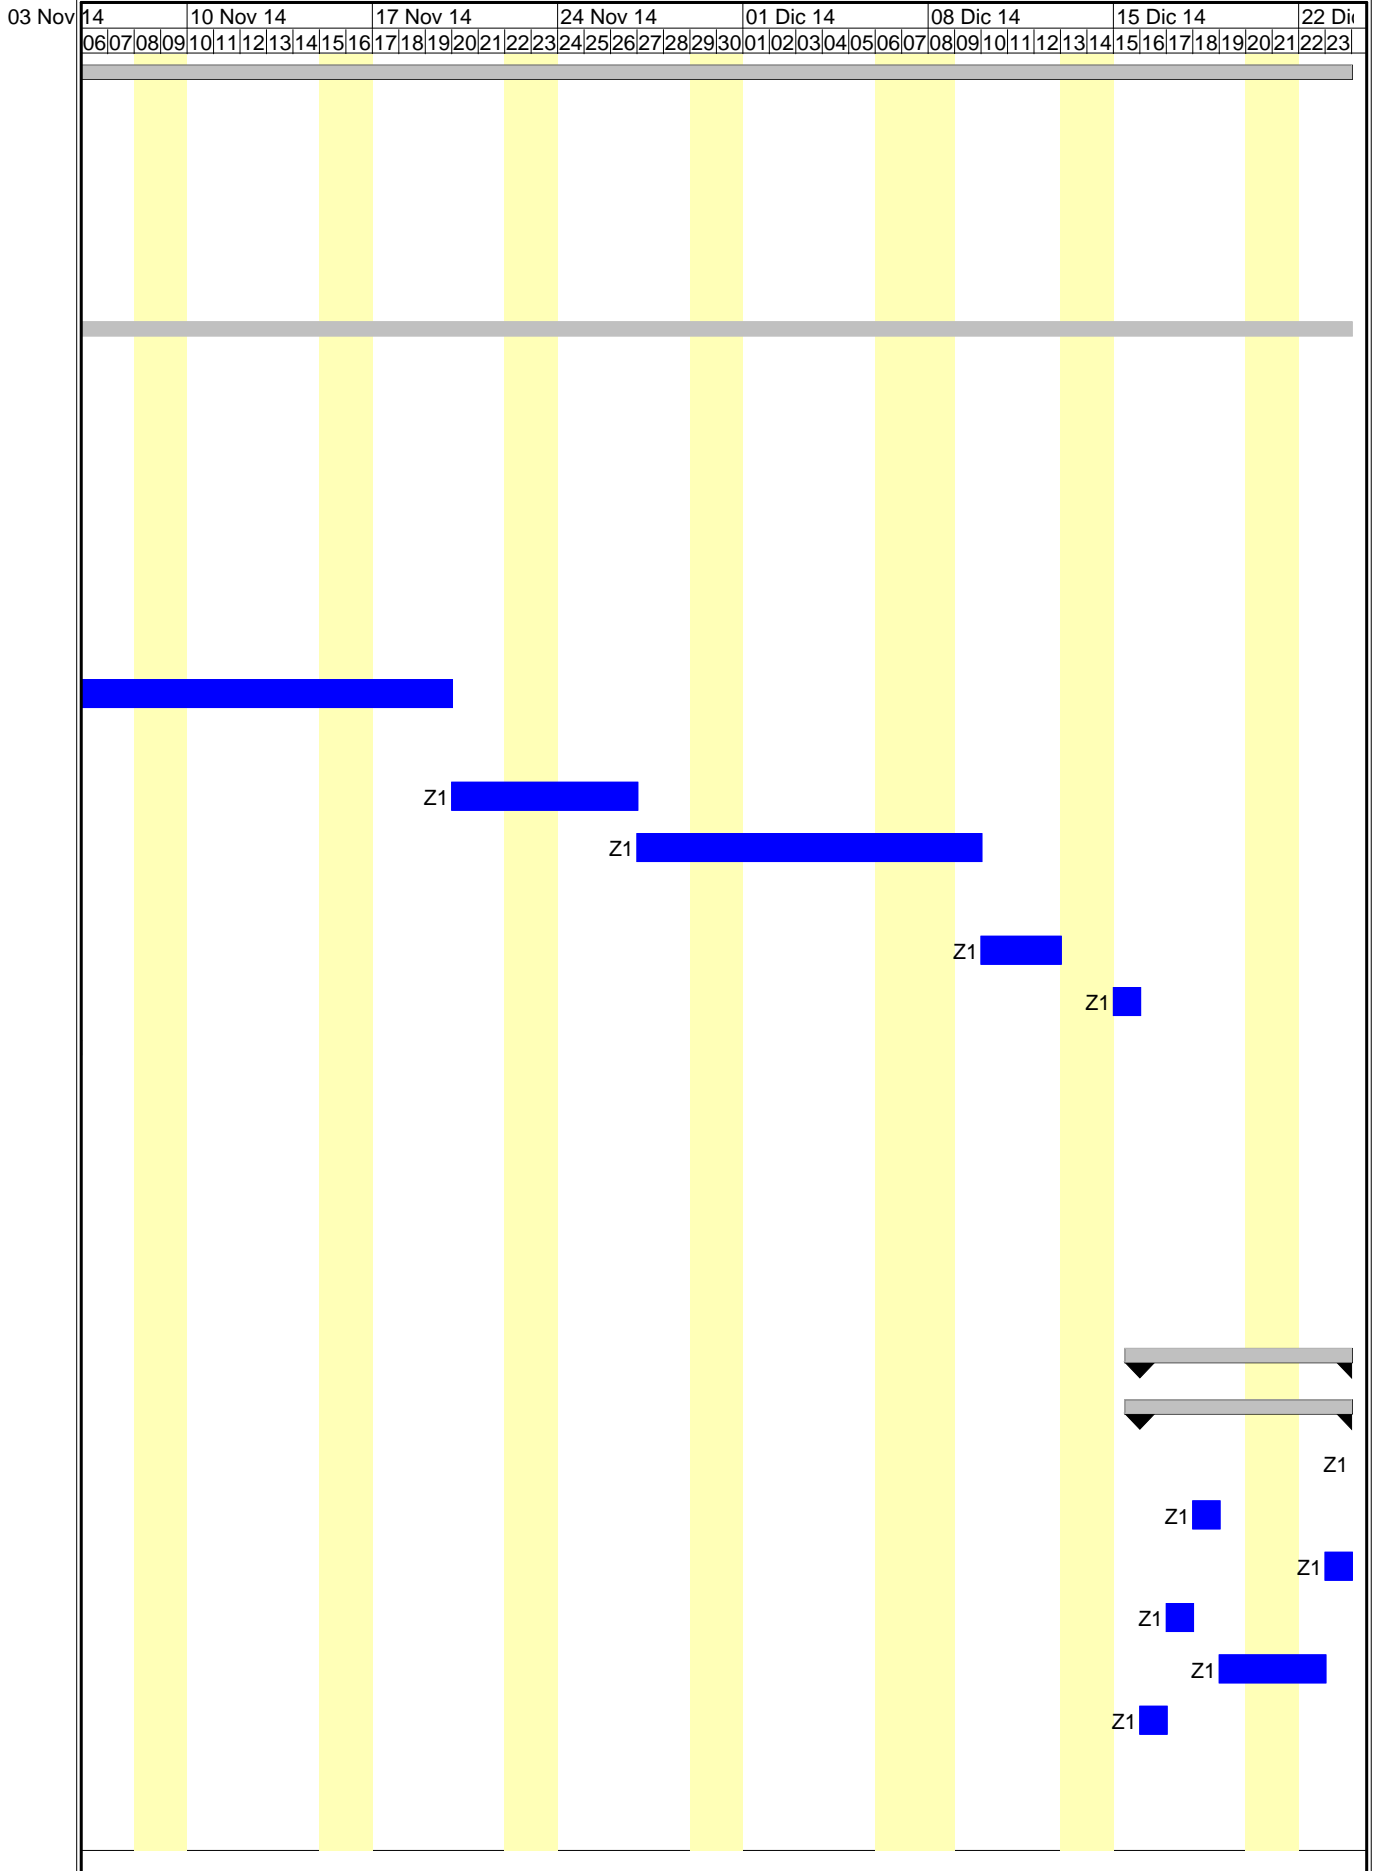

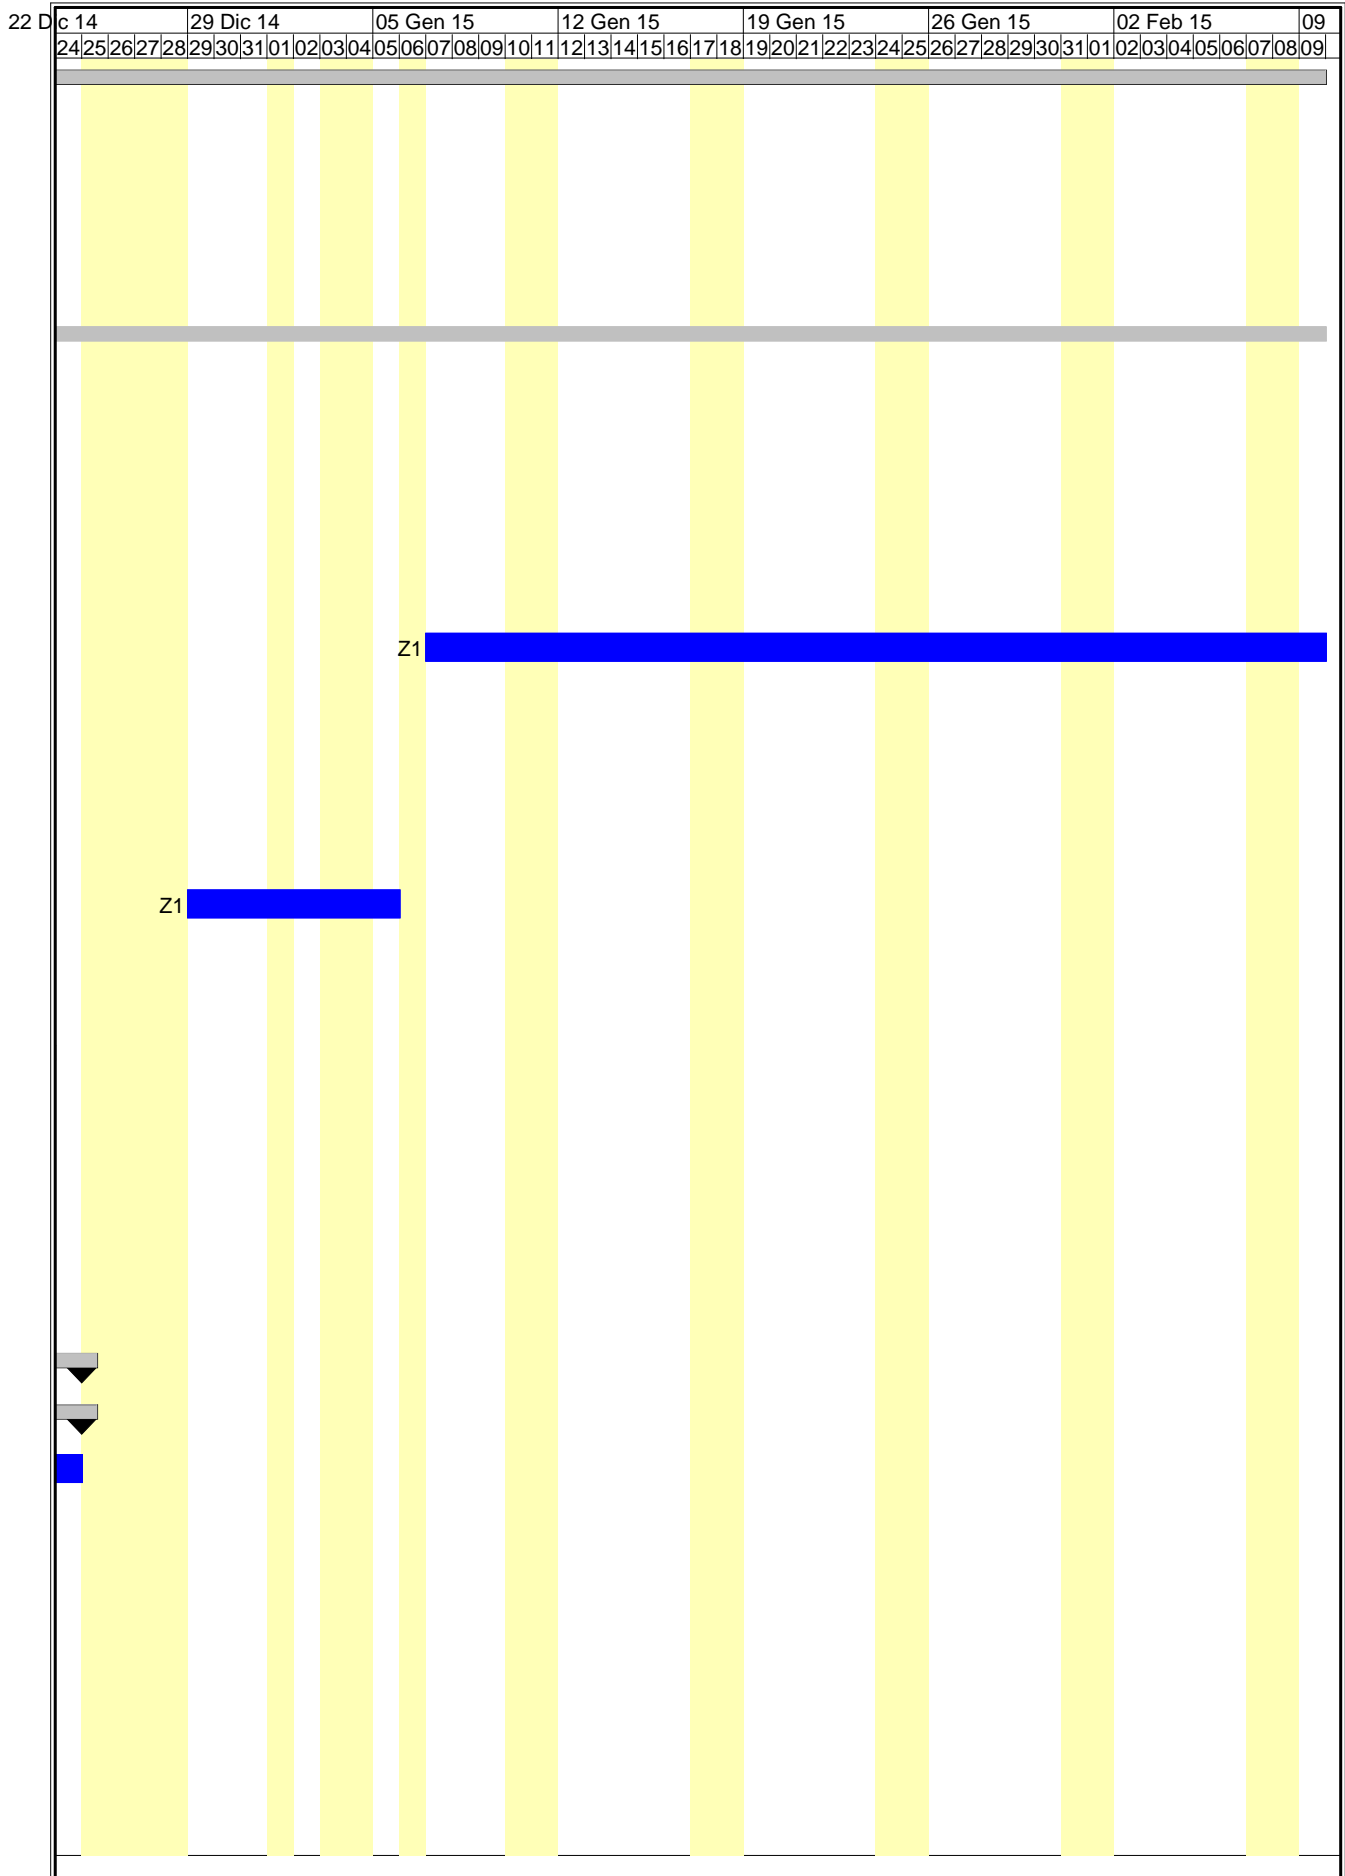

22	D	c 14	29 Dic 14	05 Gen 15	12 Gen 15	19 Gen 15	26 Gen 15	02 Feb 15	09																																								
		24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09

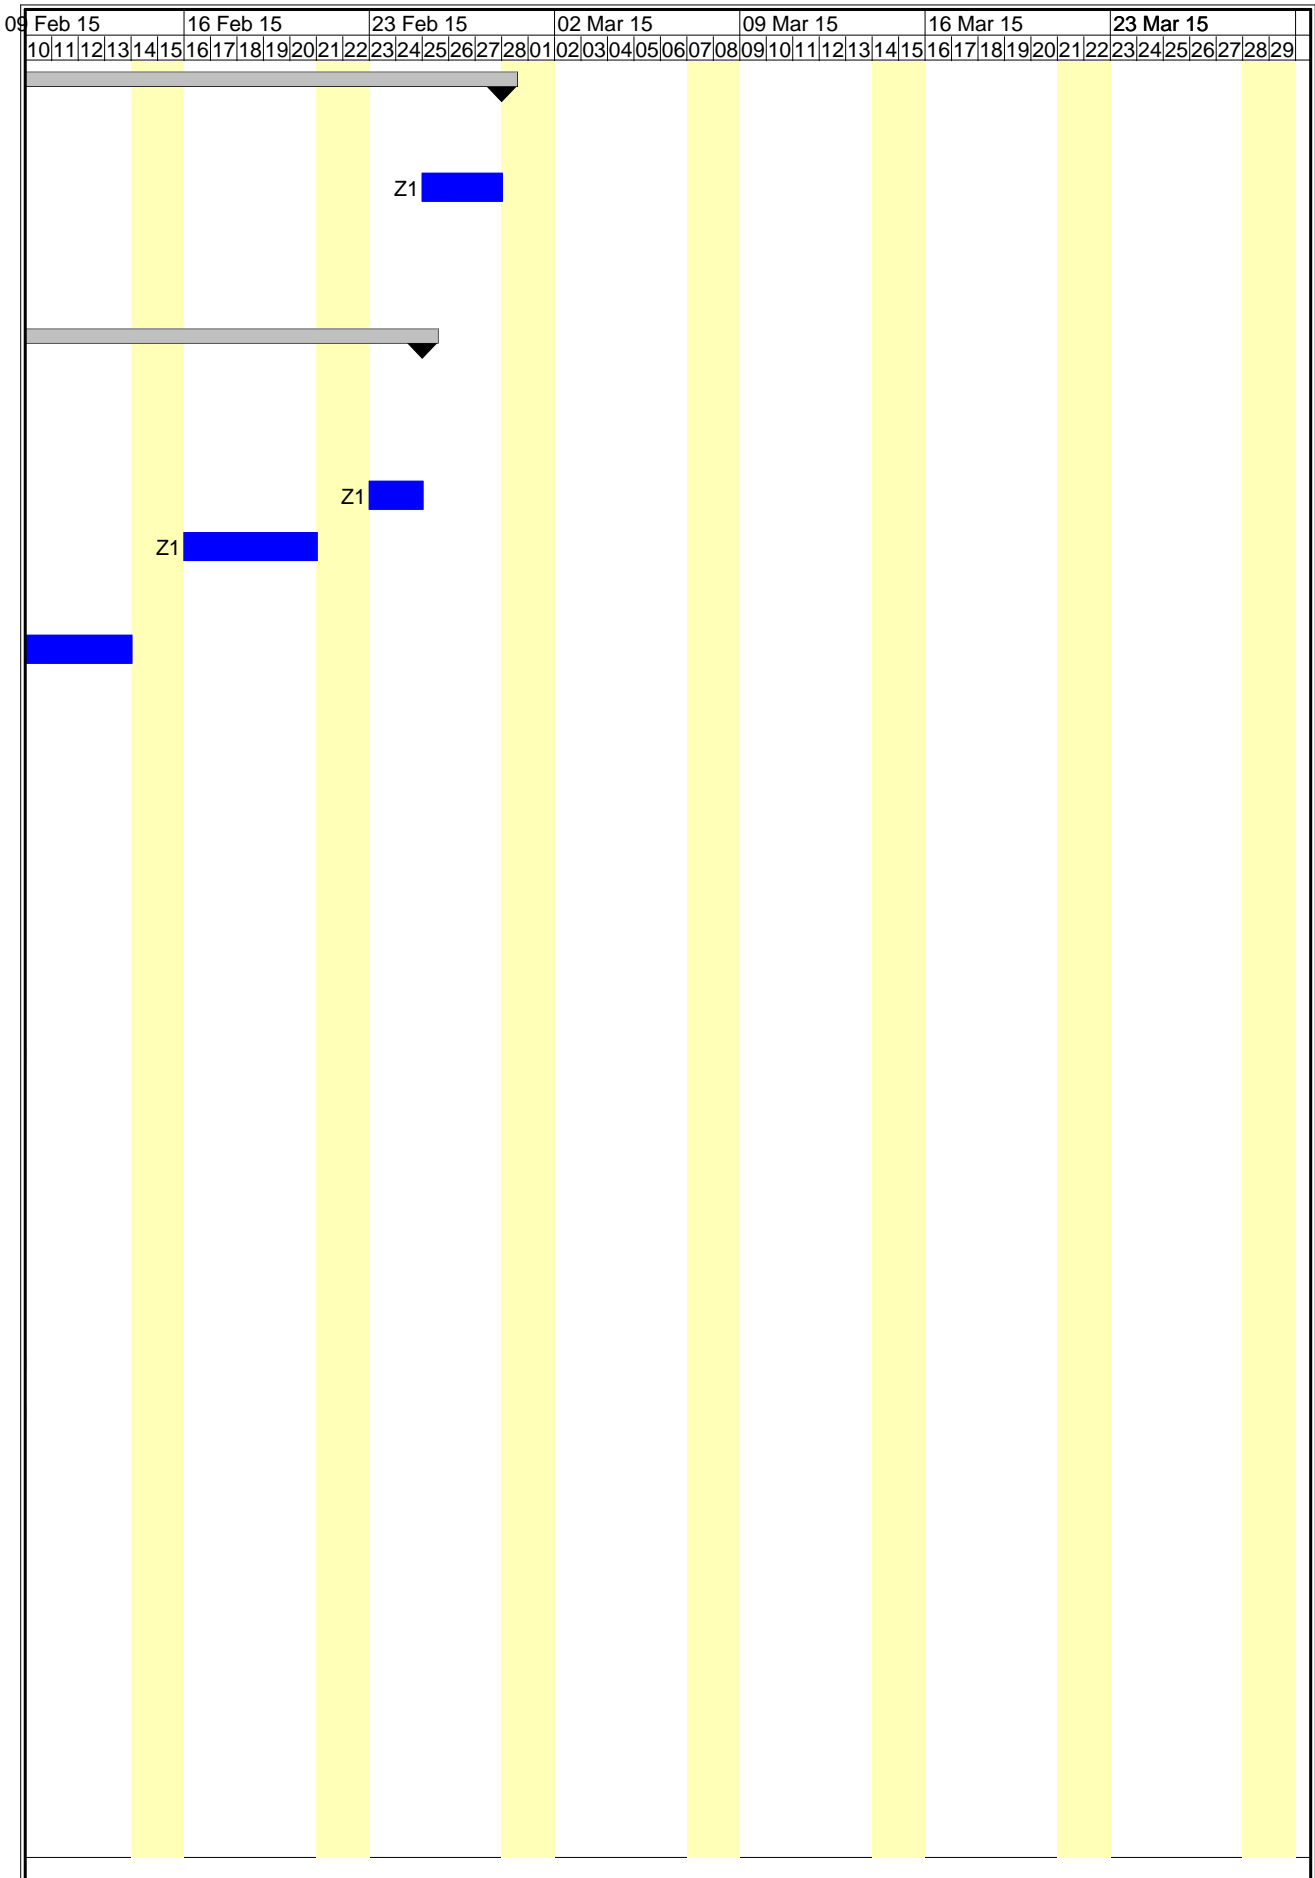

09	Feb 15				16 Feb 15				23 Feb 15				02 Mar 15				09 Mar 15				16 Mar 15				23 Mar 15																											
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
